



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Villa Montellano, R.D., 08 de julio de 2025

Estamos presentando un informe de los trabajos realizados sobre el
**Proyecto: CONTINUIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL
DRENAJE PLUVIAL DEL ÁREA DEL HOSPITAL DEL BARRIO
NUEVO (LLANURAS DEL SOL) VILLA MONTELLANO,**
Referencia No. AVMLL-MAE-PEUR-2025-0001

El domingo 23 de marzo llegamos al terreno de trabajo e iniciamos de una vez con la colocación de la vaya de identificación del proyecto y ese mismo hicimos el recorrido por todas las áreas a ser intervenida.

Al día siguiente, lunes 24 de marzo 2025 se inició con el primer picazo con todas las autoridades competente del cabildo, donde estuvieron **El alcalde Sr. Héctor Almonte**, así como las demás autoridades.

Este Proyecto se inició inmediatamente con el reconocimiento y limpieza de todo el drenaje existente para poder ver y comprobar las situaciones que este tenía antes de nuestra intervención. Por el cual dimos información a las autoridades de que tan grave era el asunto con relación a que cada vez que lluvia se inundaban las calles y toda el área a intervenir.

Recorrimos todo el casco urbano del municipio y nos percatamos de que este no tiene o tiene muy poco drenaje para poder tener un municipio libre de situaciones de inundaciones e inmediatamente los comunicamos a las autoridades., Poniéndole en conocimiento que el trabajo que se iba a realizar según lo contratado, era para una parte mínima según la magnitud de lo que se requiere hacer, y además que lo que había no era suficiente para poder recibir las aguas de toda el área a intervenir, estas con poco drenaje y con mal concebido el diseño y construcción donde nos conectaríamos.

También recomendamos un seguimiento al mantenimiento de los drenajes (**Registros, imbornales, aceras y contenes**) de manera constante para que lo existente, así como lo nuevo a construir puedan hacer su trabajo y no tengan obstrucciones en lo adelante.

A pesar de esto con el trabajo realizado el municipio tiene un gran desahogo en cuanto a su recolección de aguas residuales (Pluvial)

Presentamos un resumen fotográfico de todo el proceso mediante nuestra intervención:



Instalación vaya de identificación del proyecto.






Primer Picazo con las autoridades edilicias.





Lo primero fue Intervenir (Limpieza, construcción y reconstrucción) todo lo existente.





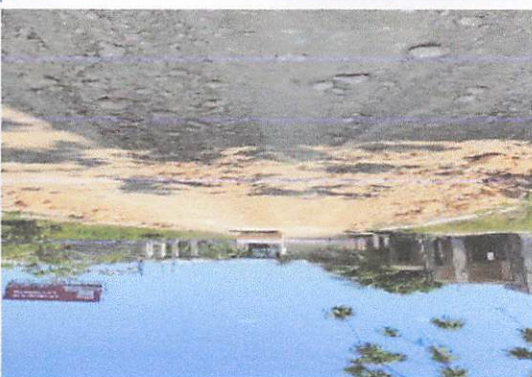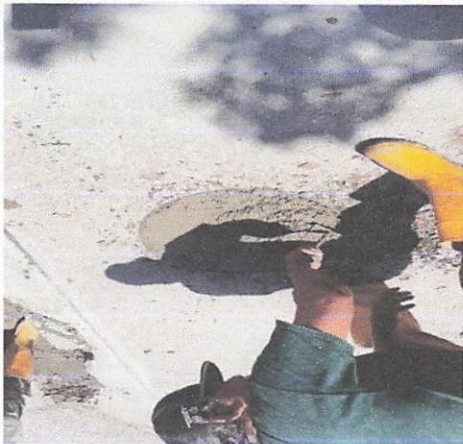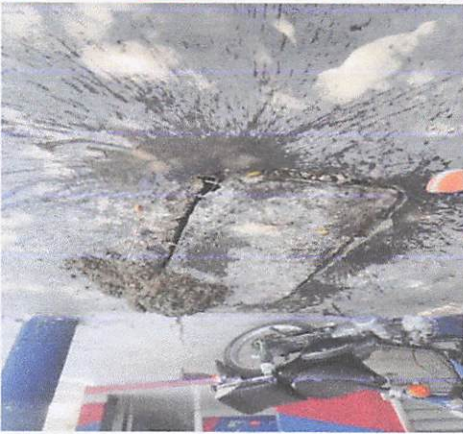


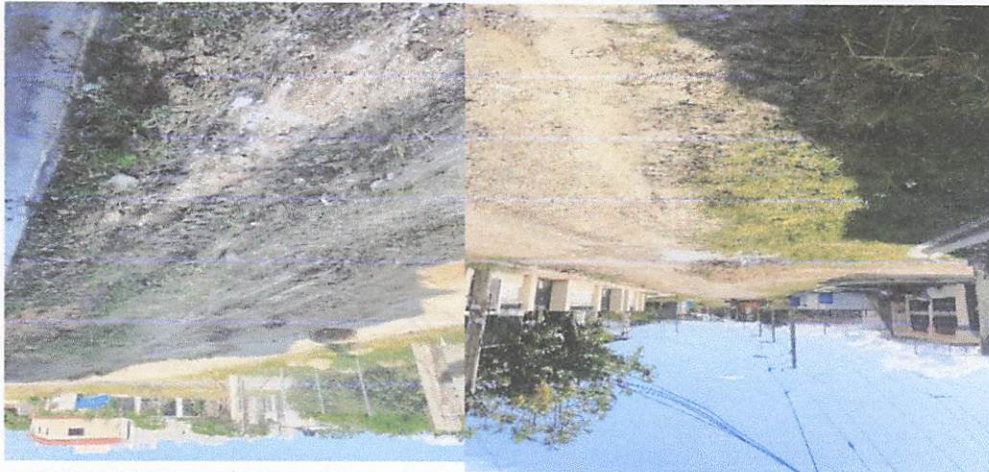


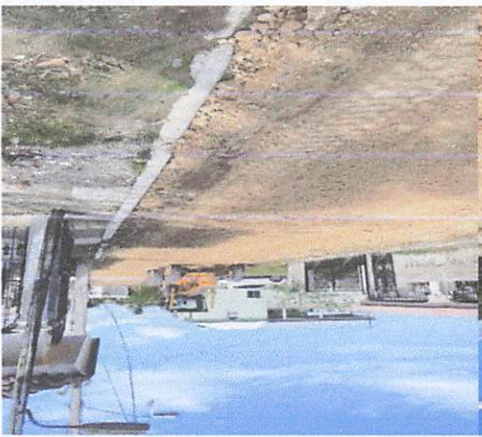






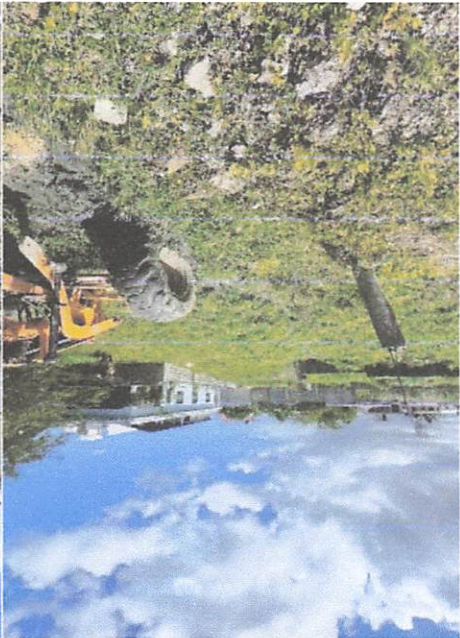

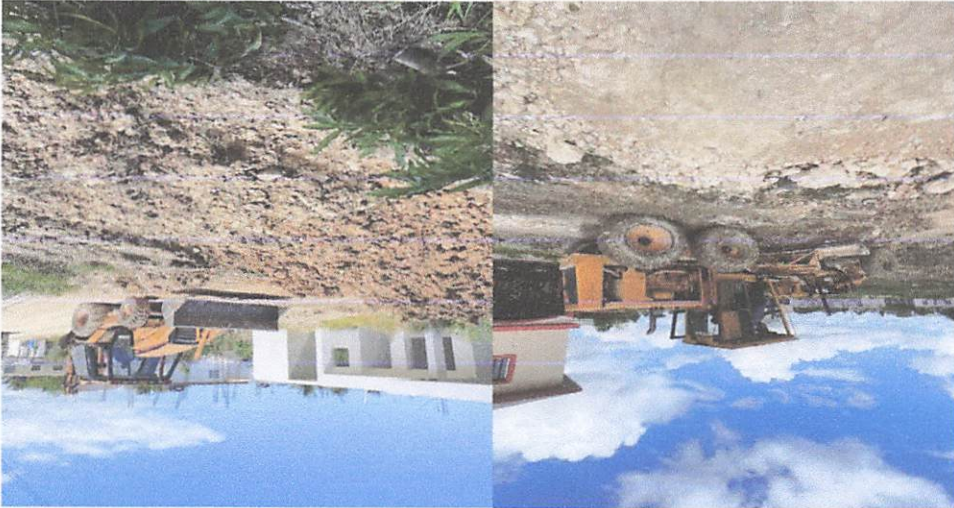

Reparaciones de tuberías y acometidas.






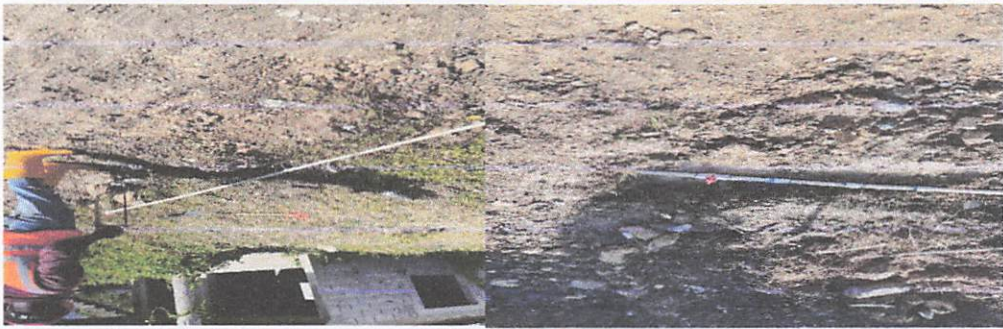










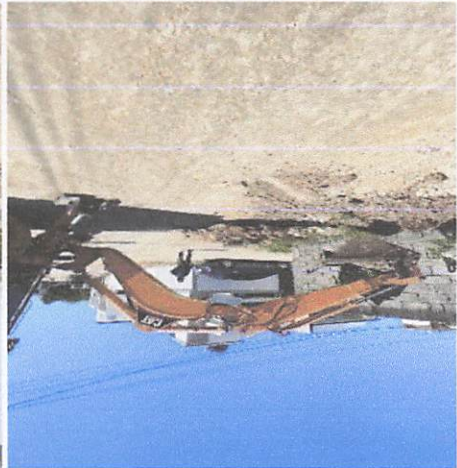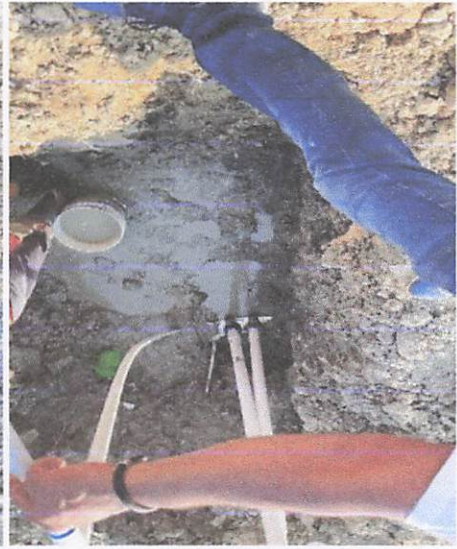

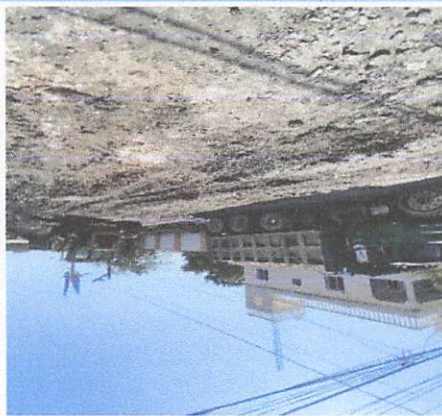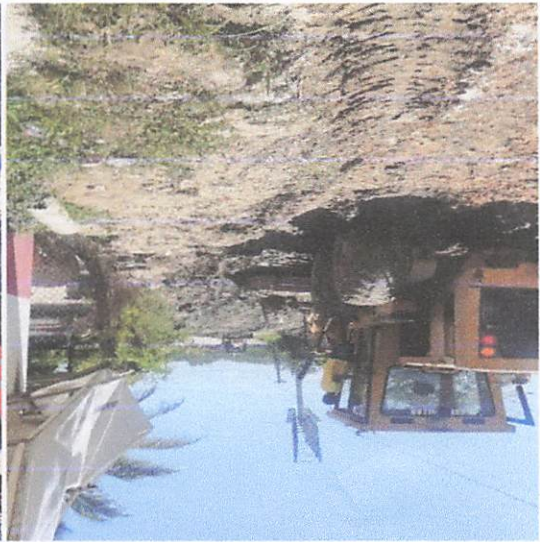

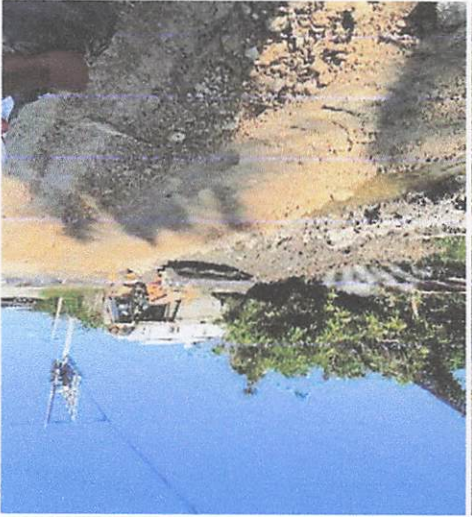
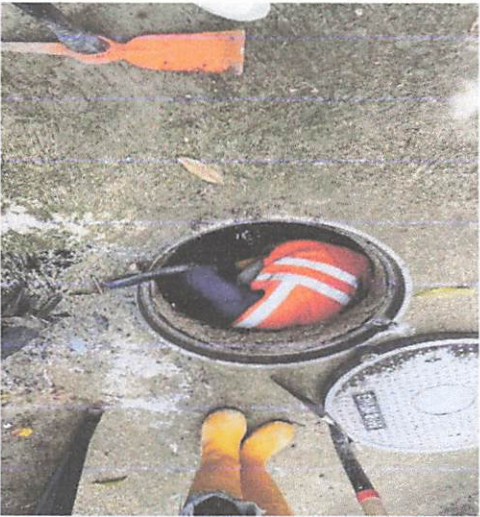













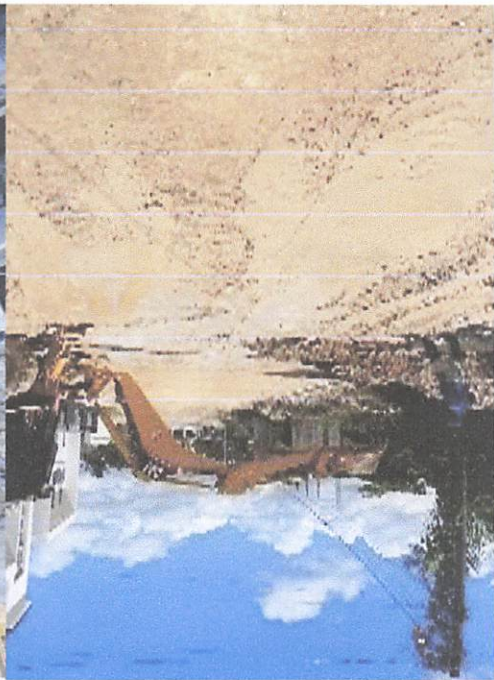
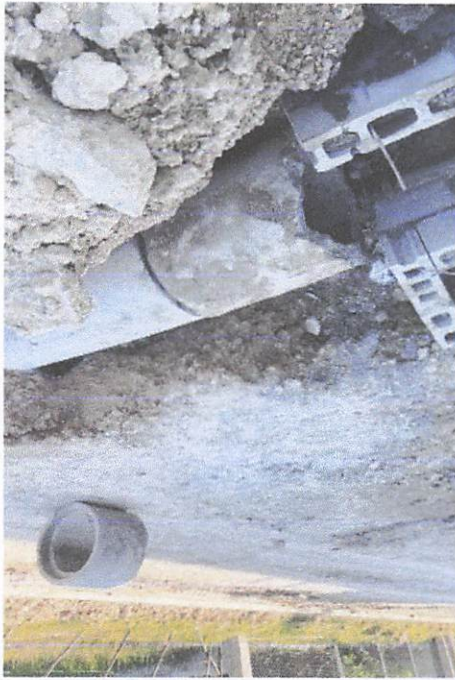






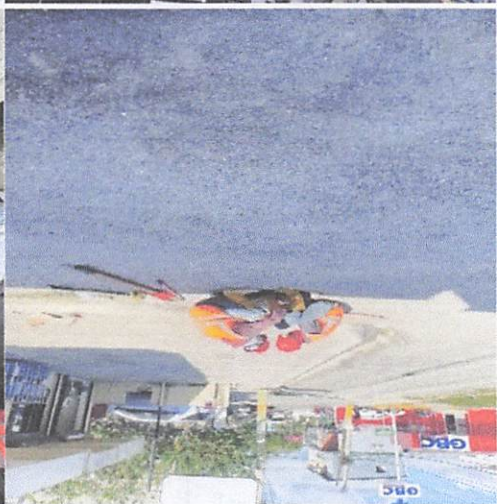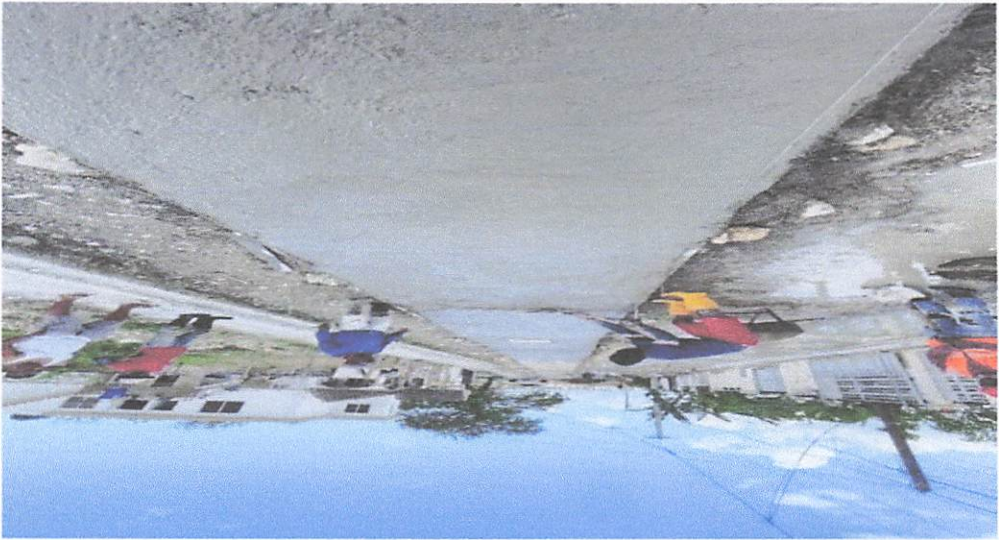







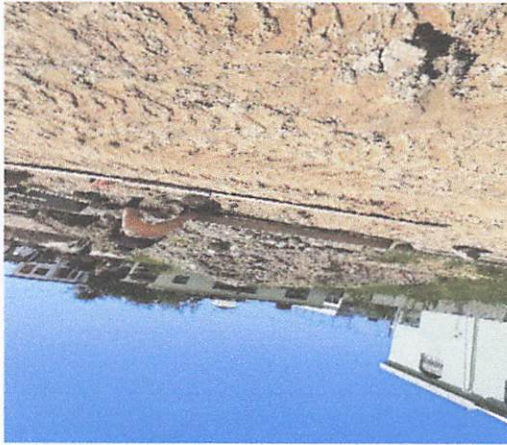

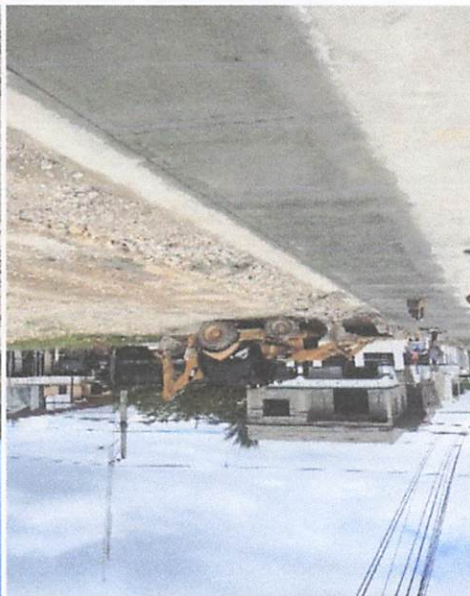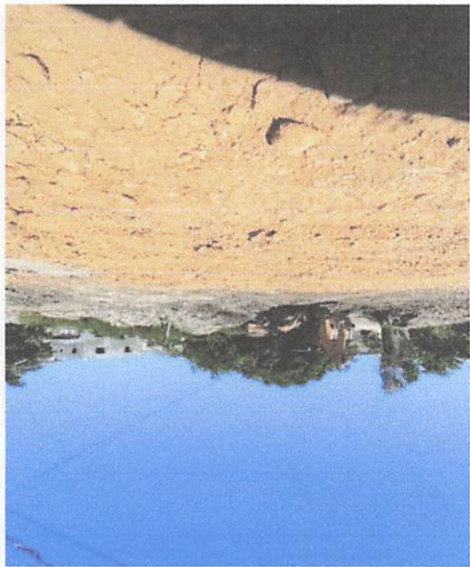


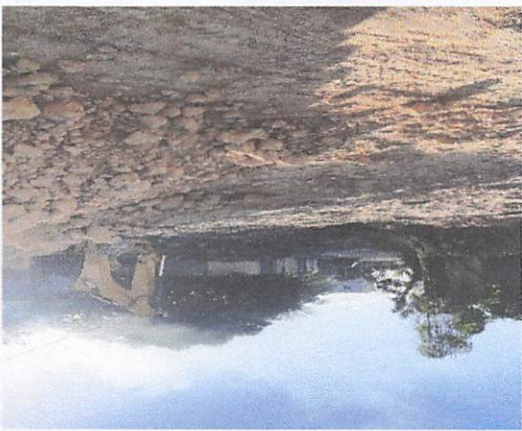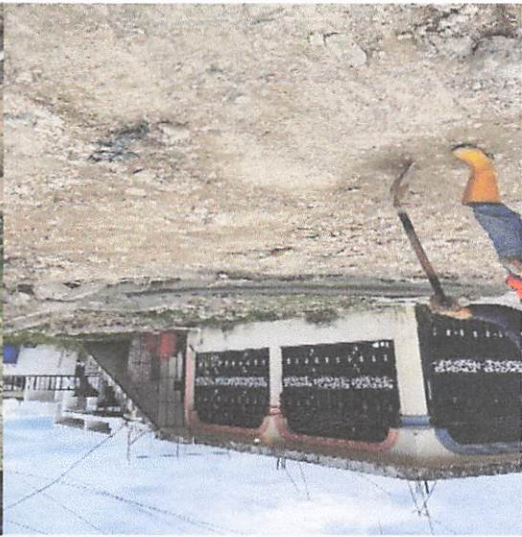


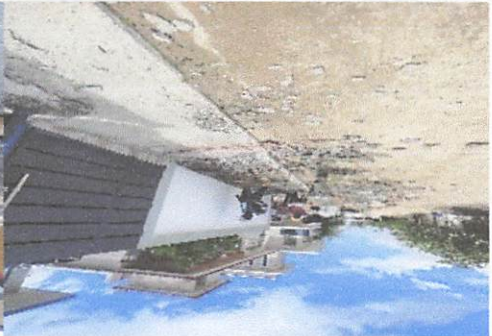


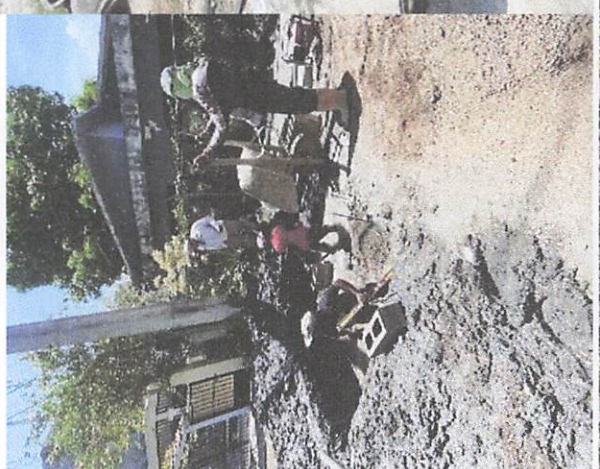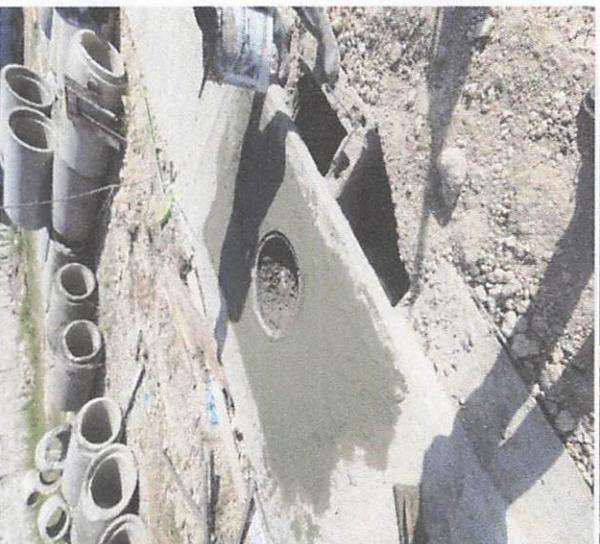
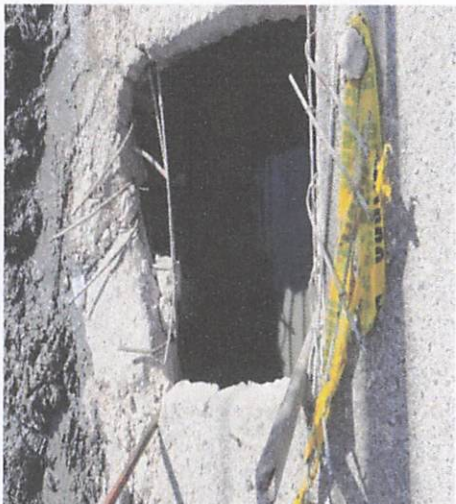






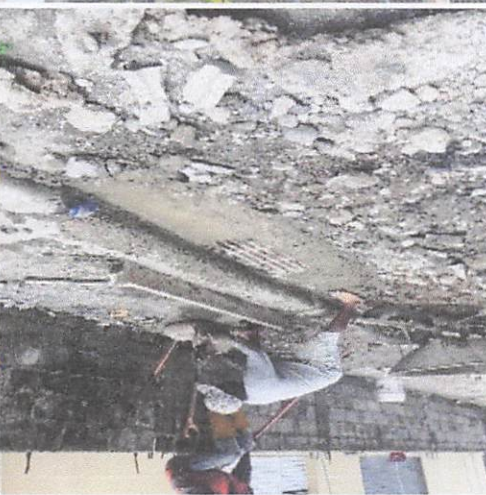


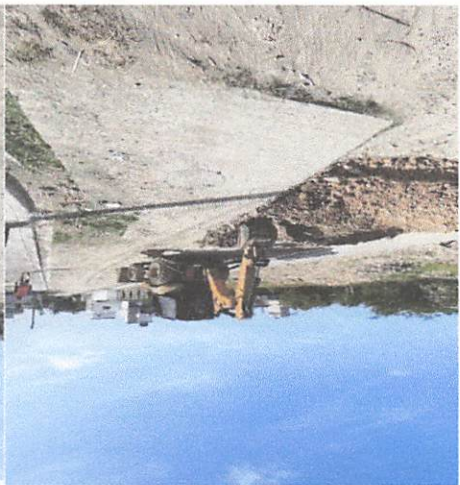




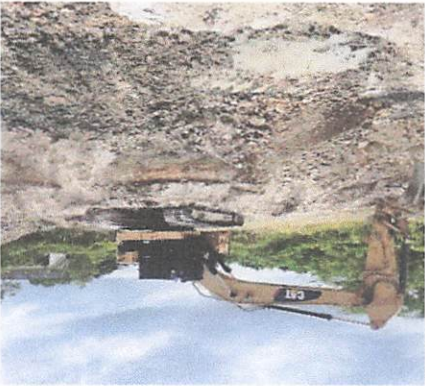


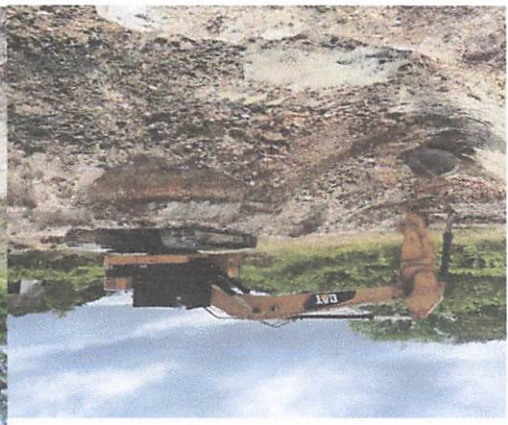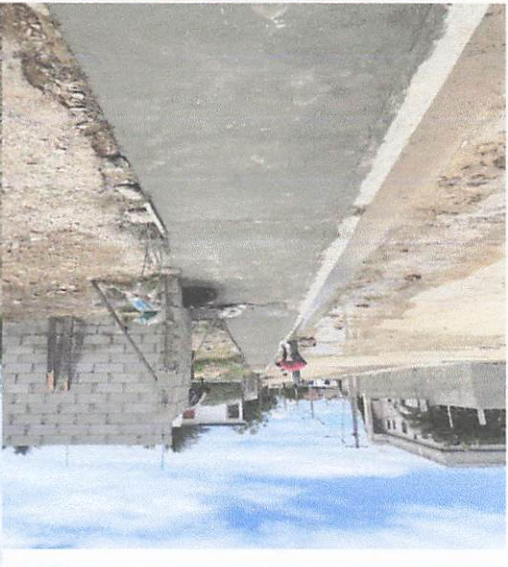

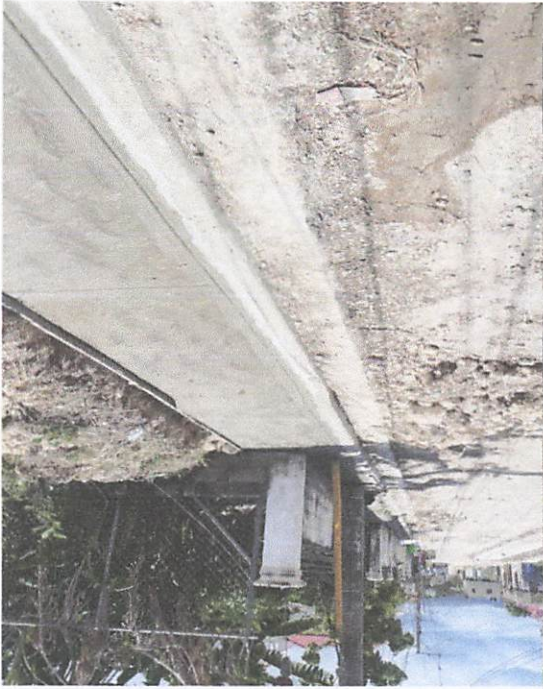

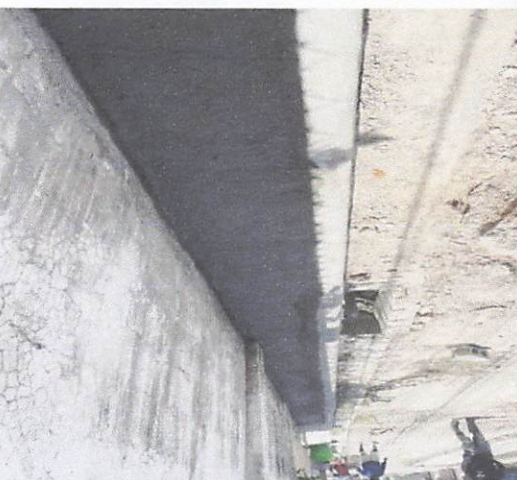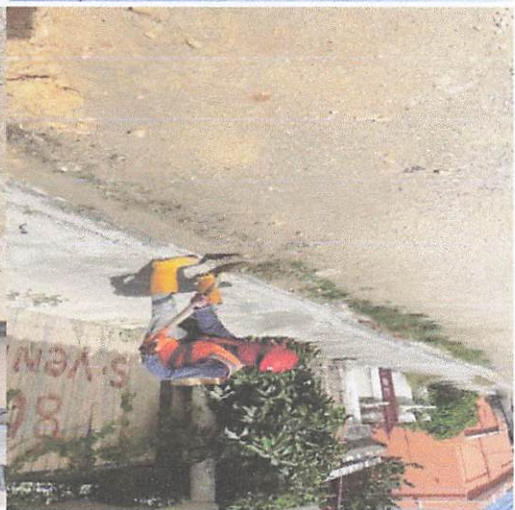

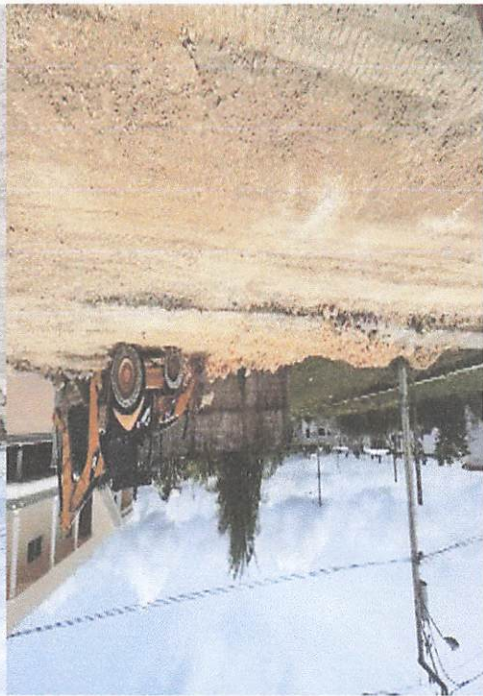

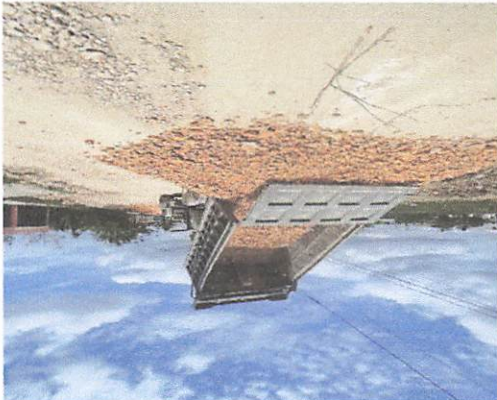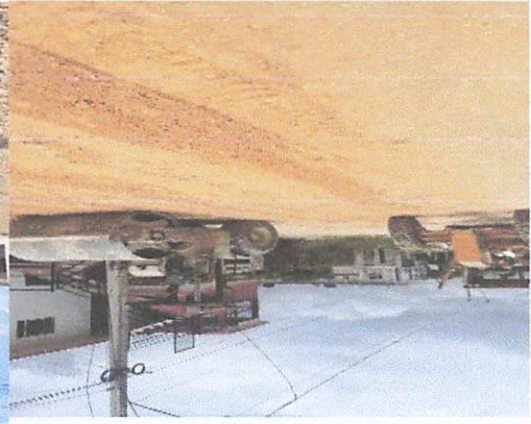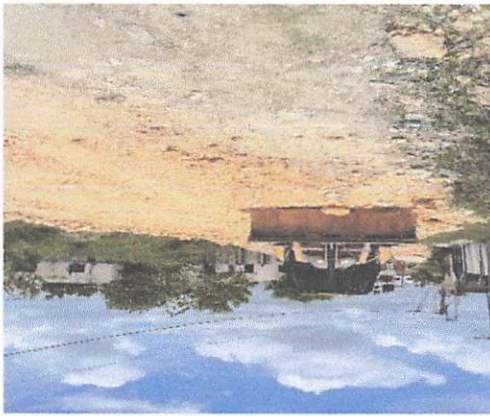



Visita de Inspeccion de los trabajos que se estan realizando por parte de la supervision y las autoridades.





Al finalizar dichos trabajos, se procedió a hacer una visita de levantamientos y verificación de los trabajos terminados y la recepción de los mismos.

Cabe destacar que no se pudo concluir con lo que hace falta para poder dejar por terminado ese sector, ya que el movimiento de tierra fue una de las partidas más considerada, ya que las calles hubo que sacarle mucho material orgánico no clasificado, además el nivel freático es muy superficial lo que provocaba que había que escavar, botar y rellenar más de lo que se había concebido en la propuesta. También muchas calles sin rellenar, faltan más contenes, badenes, registros, imbornales y aceras que hacer, así como la conectividad de algunas calles con vía principales, a través de losa de hormigón armado ya que existen canaletas y cunetas abiertas.

En conclusión, se terminó satisfactoriamente con lo contratado aunque hubo algunas dificultades ya que estuvimos trabajando ajustándonos a lo ya hecho por gobiernos anteriores con ciertas irregularidades en cuanto a diseño.

Ing. Eduardo De Leon.
